

Finanzausschuss Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 Berichtszeitraum: 01.01. – 31.10.2023

Ergebnisrechnung	Seite 3	
Investitionen 2023	Seite 4	
Darlehensbestand	Seite 10	

Finanzwirtschaftliche Entwicklung - Zeichenerläuterung

Ergebnishaushalt - Finanzdaten

- positive Abweichung zwischen Prognose und Ansatz über 15.000 Euro
- positive Abweichung zwischen Prognose und Ansatz bis zu 15.000 Euro
- keine Abweichung zwischen Prognose und Ansatz
- anegative Abweichung zwischen Prognose und Ansatz bis zu 15.000 Euro
- negative Abweichung zwischen Prognose und Ansatz über 15.000 Euro

Investitionen

Die Maßnahme ist abgeschlossen

Der Maßnahmenfortschritt ist zu mehr als 75% erreicht

Der Maßnahmenfortschritt ist zu mehr als 50% erreicht

Der Maßnahmenfortschritt ist zu mehr als 25% erreicht

Der Maßnahmenfortschritt liegt unter 25%

Spalte: Gesamtbudget beinhaltet die HH-Ermächtigungen für 2023 (inkl.

Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie evtl. notwendige

Mittelverstärkungen)

Spalte: beauftragt / Mittelumbuchung beinhaltet die Gesamtsumme der bisher beauftragten/

ausgeschriebenen Investitionen inklusive der verfügten

Investitionen

Spalte: Zahlung beinhaltet die bis zum Stichtag getätigten Auszahlungen


(Geldfluss)

Spalte: Verfügbares Budget Differenz aus "Gesamtbudget" und "beauftragt/

Mittelumbuchung"

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung		Gesan	nthaushalt		
	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Jahresprognose 2023	Abweichung Ansatz/	
Erträge und Aufwendungen	(Gesamtjahr)	(zum 31.10.)	(zum 31.12.)	Prognose	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Ordentliche Erträge	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-568.800	-460.800	-550,000	-18.800	4
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-123.159.000	-111.895.100	-133.816.800	10.657.800	•
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.748.600	0	-1.748.600	0	-
04. sonstige Transfererträge	-3.369.700	-3.318.900	-3.827.000	457.300	•
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.106.900	-2.924.800	-3.269.600	162.700	-
06. privatrechtliche Entgelte	-900.600	-948.000	-1.064.100	163.500	
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-69.491.800	-46.174.800	-65.544.400	-3.947.400	ů,
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-6.990.000	-7.246.300	-9.408.000	2.418.000	•
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.551.500	-3.839.400	-4.216.900	665.400	4
12. Summe ordentliche Erträge	-212.886.900	-176.808.100	-223.445.400	10.558.500	4
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
13. Personalaufwendungen	34.236.800	23.637.400	32.730.300	1.506.500	4
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	15.487.100	9.238.400	15.291.800	195.300	4
16. Abschreibungen	7.983.200	163.500	7.983.200	0	-
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	2.026.800	1.231.000	1.950.000	76.800	4
18. Transferaufwendungen	109.681.200	93.218.100	116.414.700	-6.733.500	(
19. sonstige ordentliche Aufw.	41.373.100	31.374.000	43.541.200	-2.168.100	
20. Summe ordentliche	210.788.200	158.862.400	217.911.100	-7.123.000	4
21. ordentliches Ergebnis	-2.098.800	-17.945.800	-5.534.300	3.435.500	4
22. außerordentliche Erträge	-85.000	-7.900	-92.900	7.900	2
23. außerordentliche Aufwendungen	1.750.000	433.600	1.758.500	-8.500	2
24. außerordentliches Ergebnis	1.665.000	425.600	1.665.600	-600	2
25. Jahresergebnis	-433.800	-17.520.100	-3.868.700	3.434.900	4

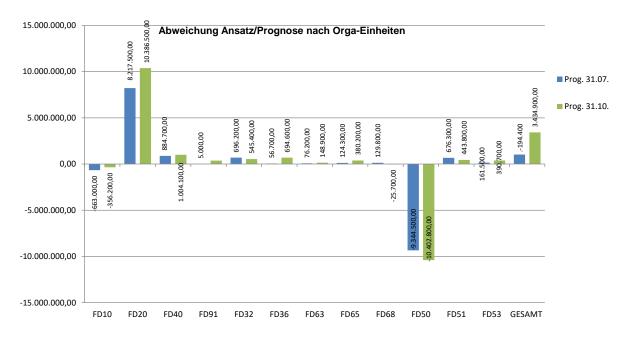

Investitionen werden ab einer Größenordnung von € 100.000 und bei Baumaßnahmen ab einer Größenordnung von € 250.000 aufgeführt.

Investitione											
OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maß nahme fortschritt
FD10	10_1200	Regalsysteme Kellerarchivierung	Die Planung ist erfolgt. Die Ausschreibung ist für Dezember 2023 vorgesehen. Bisher ist noch keine Umsetzung erfolgt, da die vorgesehenen Räume noch nicht geräumt wurden. Durch anstehende Umzüge sind Verzögerungen eingetreten. Für die Ausschreibung erfolgt eine Begehung mit Vermessung.	229.653,27	90.000,00	319.653,27	0,00	0,00	319.653,27	2024	0
FD20	20_1248	Gigabitfähiger Breitbandausbau LK	Der Baustart ist in der 26. KW 2022 erfolgt. Eine Zwischenabrechnung (rd. 18 T€) für 2022 ist erfolgt. Die Teilabrechnung der EWE in 2023 (rd. 5,6 Mio. €) befindet sich gegenwärtig noch in der Prüfung. Weitere Teilabrechnungen in 2024 und die Schlussabrechnung in 2025 werden erwartet. Insgesamt beläuft sich die der EWE geschuldete Wirtschaftlichkeitslücke auf rd. 44,4 Mio. €. Die Fördermittelgeber Bund und Land haben für die Zwischenabrechnung 2022 noch keinen Zuschuss ausgezahlt.		14.505.700,00	26.901.749,76	26.901.749,76	0,00	0,00	11. KW 2024. Es deute sich It. EWE eine Verlängerung der Ausbaudauer bis zum 30.09.2024 an.	•
FD20	20_1249	Breitbandausbau Gewerbegebiete LK	Insgesamt haben rd. 45 % der Firmen von einem kostenlosen Hausanschluss Gebrauch gemacht. Die Rechnungsstellung durch die EWE ist erfolgt und in 8/2023 beglichen worden. Die Ausgaben haben sich von eingeplanten 2.061 T€ auf 1.570 T€ reduziert. Dadurch verringem sich auch die Einnahmen (prozentuale Zuschüsse vom Bund und Land) von eingeplanten T€ 1.803 auf T€ 1.374. Die Mittelanforderung bei den Fördermittelgebern und den Kommunen ist erfolgt. Letztere liegen nahezu vollständig vor. Da sich der im September 2023 gegenüber dem Bund vorgelegte Schlussverwendungsnachweise noch in Prüfung befindet, ist bislang keine Auszahlung von Fördermitteln erfolgt. Das kann sich voraussichtlich noch über den Jahreswechsel 2023/24 hinausziehen.		0.00	2.061.000.00	1.570.000,00	1.570.000,00	491.000,00	Fertigstellung ist planmäßig zum 31.12.22 erfolgt	٠
FD32	32_1036	Einsatzleitwagen 2	Das Projekt ist abgeschlossen.	482.840,12	0,00	482.840,12	482.840,12	482.840,12	0,00	abgeschlossen	•
FD32	32_1258	Pumpenprüfstand FTZ	Das Projekt ist abgeschlossen	160.000,00	0,00	160.000,00	128.520,00	128.520,00	31.480,00	abgeschlossen	•
FD32	32_1297	Datenverbindung BBZ zur FTZ	Die Ausschreibung des Projektes ist in der Vorbereitung. Die Umsetzung ist in 2024 geplant.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.06.2024	0
FD32	32_1220	Rüstwagen (RW2)	Der Auftrag ist vergeben worden. Die Lieferung des Fahrgestells soll im Sommer 2024 erfolgen. Danach wird das Fahrzeug dem Aufbauer übergeben. Mit einer Auslieferung des Fahrzeuges wird Ende 2024/Anfang 2025 gerechnet.	0,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	5.395,28	0,00	2025	•
FD32	32_1259	Gefahrengutcontainer für Umweltzug	Die Ausschreibung ist aufgrund der bestehenden Arbeitsbelastung noch nicht erfolgt. Die Auschreibung (Leistungsverzeichnis) wird erarbeitet.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	unbestimmt	0
FD36	36_1261	2 stationäre Lasermessgeräte (Ersatz)	Im Rahmen des Austauschprogramms der Verkehrsüberwachungsanlagen im Kreisgebiet erfolgt die Neuinstallation der stationären Lasermessanlage in Huntebrück.	0,00	120.000,00	120.000,00	107.237,75	0,00	12.762,25	30.11.2023	•
		Zwischensumme / Übertrag		15.439.543.15	15.481.200.00	30.920.743.15	29.755.847.63	2.186.755.40	1.164.895.52		

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maß nahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		15.439.543,15	15.481.200,00	30.920.743,15	29.755.847,63	2.186.755,40	1.164.895,52		
FD40	40_1082	BBS-Entwicklung / Digitalisierung	2019 wurde ein Konzept erstellt zur digitalen Ausstattung der BBS. Mittlerweile wurde das Programm auf den aktuellen Stand angepasst. Hier wird ein neues Ausstattungskonzept erarbeitet. Anschaffungen der digitalen Ausstattung steht kurz bevor. In diesem geht es um den aktuellen Bedarf, wie z.B. 30-Drucker, Lasercutter usw. Aufgrund der Kurzlebigkeit der digitalen Ausstattungen ist eine Anpassung erforderlich.		0,00	1.568.992,37	91.211,86	91.211,86	1.477.780,51	fortlaufend	0
FD40	40_1111	OBS Berne Werk-/Technikraum Fachplanung	Die Ausschreibung ist abgeschlossen und das Ausstattungsmaterial für die Werk- und Technikräume (z.B. Werkzeuge, Maschinen) ist eingelagert beim Hersteller und in der Aula, so dass das Ausstattungsmaterial bereit steht. Die Installation kann erst nach der baulichen Fertigstellung erfolgen. Diese steht durch das fehlende Personal in FD65 noch aus.	154.476.59	0.00	154.476.59	154.476.59	50.113.86	0.00	unbestimmt	•
FD40	40_1213	OBS Jade neues Raumprogramm	Erste Möbel wurden beschafft. Eine weitere große Ausschreibung ist in der Umsetzung.								0
FD40	40_1058	OBS Elsfleth 4 FUR	Die Ausschreibungen sind abgeschlossen. Die Ausstattung für die Fachunterrichtsräume wird zur Zeit eingelagert, da die bauliche Fertigstellung noch aussteht. Nach der baulichen Fertigstellung erfolgt die Installation.	147.914,07 210.146.42	0,00	147.914,07 320.146.42	2.138,43	2.138,43	145.775,64	Anfang 2024 unbestimmt	•
FD40	40_1190	OBS I/BBS N'ham Raumprogramm	Ein Physikraum wurde bereits fertiggestellt. Die Gesamtumsetzung wird nach Feststellung des kompletten Ausstattungsbedarfs erfolgen. Hier ist die bauliche Entwicklung bestimmend. Erste Möbel wurden beschafft.		13.000.00	102.883.42	8.617.98	8.617.98	94.265.44	unbestimmt	0
FD40	40_1214	OBS Rodenkirchen FUR Technik	Die Verhandlungen mit dem Fachplaner laufen über den Umfang der notwendigen Ausstattung. Der erste Vorschlag der Fachplaung übersteigt das Budget deutlich. Der Fachplaner wurde aufgefordert die Kosten zu senken.		110.000.00		0,00	0.00	255.455,76	unbestimmt	0
FD40	40_1223	Digitalpakt Schulen ohne BBS Bereich	Die Ausschreibung der EDV-Geräte ist beendet. Die Geräte wurden geliefert und installiert.	76.714.55	150.000.00	226.714.55	226.714.55	223,620,55	0.00	Ende 2023	•
FD40	40_1281	Gymn. Nordenham Ganztags-Mensa	Es laufen Planungen die Mensa zu erweitern, umzustrukturieren und die Ausstattung teilweise zu erneuern. Der Mensabetrieb ist im September 2023 in den alten Räumlichkeiten angelaufen. Die genaue Bedarfserhebung über die Notwendigkeit des Ausbaus der Mensa ist noch nicht abgeschlossen.	i •	165.000,00	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	3. Quartal 2024	0
FD40	40_1284	BBS Brake/ KfzBereich Erweiterung Anl.VM	Zur Zeit Läuft eine Ausschreibung eines Fachplaners. Erste Anfragen haben keine Ergebnisse gebracht.	60.000,00	100.000.00	160.000,00	0.00	0.00	160.000,00	unbestimmt	0
FD40	40_1312	Get-Your-Own-Device / So.Programm	Das Programm wurde beendet. Die digitalen Endgeräte werden nun über die Eltern beschafft. Zur Zeit läuft eine Anfrage bei FD 20 über die weitere Verwendung der bereits eingestellten Mittel aus den Jahren 2022+2023 zur digitalen Ausstattung der Schulen. Allerdings muss das Gesamtbudget um den Anteil an Einzahlungen (€107.900), die nun nicht erfolgen, reduziert werden.		365.600,00	432.900,00	0.00			3. Quartal 2024	0
FD40	40_887	Maritimer Campus Erwerb Anlagevermögen	Es werden jedes Jahr investive Mittel für die Ausstattung des Anlagevermögens (z.B. Dom, Schwimmbad) eingeplant, um den erforderlichen technischen Stand zu gewährleisten. Anlagevermögen wurde bisher nicht beschafft					7			0
		Zuischen auswere / Überten		63.085,95	43.900,00	106.985,95	0,00	0,00	106.985,95	unbestimmt	
		Zwischensumme / Übertrag		18.039.712.28	16.538.700.00	34.578.412.28	30.559.153.46	2.562.458.08	4.019.258.82		4

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maß nahmen fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		18.039.712,28	16.538.700,00	34.578.412,28	30.559.153,46	2.562.458,08	4.019.258,82		
FD 65	65_1157	OBS I Nordenham/ Erweiterungsbau lt. Raumkonzep	Der Workshop hat stattgefunden. Die weiteren Entscheidungen werden in den politischen Gremien getroffen. Abschließende Festlegungen sind noch offen, so dass die Verwendung der Mittel noch nicht geklärt werden kann. Eine weitere Bautätigkeit ist daher noch nicht erfolgt.	325.640,96	0,00	325.640,96	0,00	0,00	325.640,96	unbestimmt	0
FD65	65_1169	OBS Jade/ Aula Sanierung incl. Schadstoffs.	Die Dach- und Lüftungsarbeiten sind in der Ausführung. Die angepassten Trockenbauarbeiten sind beauftragt. Die weiteren Verglasungsarbeiten sind fast abgeschlossen. Der Mittelansatz ist insgesamt trotz Aufstockung noch nicht ausreichend. Es müssen noch Ausschreibungen für Bühnenbau, Bodenbelagsarbeiten und Elektrik vorgenommen werden. Eine Klärung erfolgt kurzfristig, um einen Ausgleich aus anderen Maßnahmen zu ermöglichen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf über T€ 625 geschätzt.	490.000,00	0.00	490.000.00	466.177.53	75.263,25	23.822,47	Anfang 2024	•
FD 65	65_1171	OBS Rodenkirchen Fenster mit Sonnenschutz	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Dach- und Fassadensanierung (PSP 65_1174 und 65_1172). Es ist weiterhin geplant, die drei Teilmaßnahmen in einem zeitlichen Zusammenhang durchzuführen und durch den Synergieeffekt (z.B. Gerüstbau) wirtschaftlicher zu werden. Weitere bzw. neue Abstimmungen mit dem noch zu vervollständigendem Planungsteam sind aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage erforderlich.								0
FD65	65_1174	OBS Rodenkirchen Dachsanierung Geb. Block 2	siehe Erläuterung zu 65_1171. Eine Integration von regenerativer Energiegewinnung wurde mit in die Vorüberlegungen aufgenommen (z.B. PV an Fassde und auf dem Dach des Geb. 2). Ein erstes Sondierungsgespräch ist am 04.08.2023 erfolgt.	490.759,86	0,00		22.054,27	0,00			0
FD 65	65_1181	BBS Nordenham Dachsanierung Block 4/5 EG	Vorarbeiten zur Ermittlung der Konstruktion und des bisherigen Aufbaus werden in diesem Jahr erfolgen. Eine besondere Berücksichtigung erfährt der Aspekt "vorhandene Schadstoffe" und die mögliche Integration von PV (eneuerbare Energie). Mit der Planung wird in 2023 begonnen	395,000,00	0.00		0.00	0.00	395,000,00	Ende 2024	0
FD65	65_1187	Gesundheitsamt Dachsanierung	Für 2024 sollen Planungsmittel zur Beauftragung eines externen Büros eingestellt werden, um einen Teil- oder Komplettneubau zu planen. Aus diesem Grund ist die geplante Dachsanierung zunächst zurückzustellen.	293.000,00	0,00		0,00	0,00	293.000,00	unbestimmt	0
FD 65	65_1196	BBS Digitalisierung Netztwerk	Die finale Bearbeitung der Telefonie ist abgeschlossen. Die Maßnahme ist damit beendet.	438.124,12	0,00	438.124,12	438.124,12	0,00	0,00	abgeschlossen	•
FD65	65_1234	BBS Brake Bauhalle/Werkstattber. Heizung/Sanitär	Durch den geplanten Anbau KFZ sind neuerliche Umplanungen erforderlich. Die Projektleitung ist aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse derzeit vakant.	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	0,00	0,00	2.101.000,00	unbestimmt	0
FD65	65_1267	BBS Nordenham Dachsanierung Block 1	Derzeit erfolgt die Vorplanung der Dachentwässerung, um die unterschiedlichen Anforderungen (Potentiale PV, Klein-WEA, Statik, Entwässerung) in Einklang zu bringen. Der Planungsauftrag wird kurzfristig vergeben.	446.000,00	0,00	,	0,00	0,00		Ende 2024	0
		Zwischensumme / Übertrag		23.406.237,22	16.538.700,00	39.944.937,22	31.485.509,38	2.637.721.33	8.459.427.84		

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maß nahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		23.406.237,22		39.944.937,22	31.485.509,38	2.637.721,33	8.459.427,84		
FD 65	65_969	OBS Elsfleth Fassadenelemente Gebäude 5/6	Zur Zeit laufen Wiederaufnahmevorbereitung nach einer	20.100.201,22	10.000.700,00	00.01.1007,22	0111001000,00	2.007.772.1,00	0.100.127,01		
			Projektablaufstörung. Ein Vorgespräch mit der Schule zum möglichen Maßnahmenablauf ist erfolgt.	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	Herbst 2024	0
FD65	65_676	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Die verbleibenden Restarbeiten wurden geprüft. Die					,			
			Schlussrechnungen sind fast vollständig bearbeitet. Der								
			Mittelabruf ist in Abhängigkeit zu den Schlussrechnungen in								
			Vorbereitung. Die letzte Ausschreibung (außerhalb des								
			Förderprogramms - Parkplatzsanierung) ist mit einem guten								
			Ergebnis eröffnet worden und derzeit in der Vergabeprüfung. Gemäß Abstimmung mit FDL20 werden die benötigten Mittel							Ende 2023 /	
			aus anderen Maßnahmen verstärkt.	555,530,41	0.00	555.530.41	555.530.41	53.484.84	0.00	Parkplatz Mitte 2024	
FD65	65 1114	BBS Elsfleth/ Aufzugsanlage + Planungsk.	Das Projekt ist in Zeitverzug geraten, da die ausgewählten	555.550,41	0,00	555.550,41	333.330,41	55.464,64	0,00	2024	
1 000	05_1114	DDO LISHELL Adizugsanlage + Flandingsk.	fachbeteiligten Planer voll ausgelastet sind. Zeitgleich ist durch								
			mangelnde Kapazität im FD 65 die weitere Bearbeitung								0
			vorübergehend verzögert.	255.000,00	100.000,00	355.000,00	0,00	0.00	355.000,00	unbestimmt	
FD65	65 1210	OBS Jade Dachsanierung	Die Dacharbeiten wurden bereits ausgeschrieben. Die		,		-,	3,55			
	_		Auftragsvergabe hat stattgefunden. Die Dacharbeiten werden								
			derzeit durchgeführt. Die PV-Anlage wurde bereits								
			ausgeschrieben und beauftragt. Die Ausführung der Anlage								
			beginnt im März 2024.	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	96.449,91	0,00	Anfang 2024	
FD65	65_1211	OBS Jade Anbau Klassen	Die Ausschreibungsverfahren für Bodenbelagsarbeiten,								
			Estricharbeiten, Putz- und Fliesenarbeiten usw. wurden bereits durchgeführt. Die Roh-, Dach- und Verglasungsarbeiten sind								
			abgeschlossen. Die Innenarbeiten (Trocken-, Maler-								
			Bodenbelagsarbeiten usw.) werden derzeit durchgeführt. Die								_
			PV-Anlage wurde bereits ausgeschrieben und beauftragt. Diese								
			Arbeiten werden im März 2024 durchgeführt.	1.858.165,40	500.000,00	2.358.165,40	2.358.165,40	651.575,49	0,00	Anfang 2024	
FD65	65_1232	BBS Brake Schadstoffs. 1. OG.	Alle größeren Maßnahmen an der BBS (BBZ) stehen in	,				5511515,15	-,		
			direktem oder indirekten Zusammenhang. Durch den Ausfall der								
			Projektleitung muss der Sachstand aller Maßnahmen erneut								
			abgeglichen werden. Außerdem sind im Nachgang zur								
			Pandemie frühere Abstimmungen mit der Schulleitung zu								0
	1		Sanierungsabläufen hinfällig, sodass für alle Teile dieses "Multi-								
			Projektes" an der BBS ein Gesamtplan erstellt werden muss. Die langen mehrjährigen Vorbereitungen zur Haushaltsplanung								
			fanden vor der Corona-Pandemie statt.	0.00	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	unbestimmt	
FD65	65 1233	BBS Brake/ WC-Sanierung	Die Maßnahme wird neu aufgelegt und voraussichtlich mit den	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	unbestimint	
1 000	00_1200	DEC DIGING WO-Dailierung	Planungen für die WC-Anlage am Treppenhaus 3 begonnen.	500.000,00	630.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	unboatime*	0
FD65	65 1237	BBS Brake/ Gebäudeautomation	Das Budget wurde beliehen in Höhe von T€ 100 und dem Budget		630.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	unbestimmt	
1 200	00_1207	250 States, Cobaddoddomation	65 676 Kreishaussanierung zur Verfügung gestellt. Es besteht								
			weiterhin dringender Handlungsbedarf. Ein Ausführungstermin								
			kann jedoch noch nicht genannt werden. Die aktuellen								
			Ereignisse auf dem Energiesektor müssen neu bewertet								0
	1		werden. Zwischenzeitlich wurde der Teilbereich								
			Heizkesselsanierung nahezu fertig. Die Gebäudeautomation								
			wird zunächst nur entsprechend angepasst.	500.000,00				0,00	,	unbestimmt	
		Zwischensumme / Übertrag		27.364.933,03	19.246.700,00	46.611.633,03	34.827.205,19	3.439.231,57	11.784.427,84		

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
					Haushaltsplan						
		Zwischensumme / Übertrag		27.364.933,03	19.246.700,00	46.611.633,03	34.827.205,19	3.439.231,57	11.784.427,84		
FD65	65_1238	BBS Brake/An- / Umbau Kfz-Bereich	Konkrete Vorplanungen wurden durchgeführt. Eine letzte		·	,	,		ŕ		
			Abstimmung (mit Freigabe) mit dem FD 40 ist weiterhin noch								
			offen. Erste Gespräche zur Auswahl der Fachplaner haben								_
			stattgefunden. Ein Projektstart wird erfolgen können, wenn klar								0
			ist, welche Randbedingungen final beachtet werden müssen								
			(z.B. Kreishandwerkerschaft).	1.049.298,65	1.281.000,00	2.330.298,65	0,00	0,00	2.330.298,65	unbestimmt	
FD65	65_1239	BBS Brake/ Fenster 2.OG	Die Abstimmungen zur Sanierungsplanung konnten noch nicht								
			abgeschlossen werden. Derzeit besteht außerdem ein								
			erhebliches Kapazitätsproblem im FD65. Weiter sind die								
			Erläuterungen der Maßnahmen 1232, 1233, 1237 und 1238 zu								0
			berücksichtigen, da die Maßnahmen in Wechselwirkung								
			zueinander stehen.	55.000,00	642.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	unbestimmt	
FD65	65_1242	Zentrale DigitMaßn. Schulen (ohne BBS)	BBS Nordenham + OBS Nordenham nähern sich der								
			Fertigstellung. Zwischenzeitlich mussten Anpassungen in dem								
			Ausführungszeitraum erfolgen. OBS Elsfleth ist abgenommen								
			und schlussgerechnet. IGS Brake wurde am 09.11.2023								
			abgenommen und ist bis auf kleine Nacharbeiten fertig. Die								
			Schlussrechnung erfolgt noch in 2023. OBS Jade ist								
			abgenommen und schlussgerechnet. Die ergänzende								•
			Maßnahme der Digitalisierung OBS Rodenkirchen wird mit								
			Einbindung der IP-Telefonie in Kürze abgeschlossen.								
			Gymnasium Nordenham (Austausch zentraler Komponenten								
			und Einbau USV) sind abgeschlossen. Mängelbeseitigung bzw. Nacharbeit Dokumentation wird noch in 2023 abgeschlossen.								
			Weitere neue Teilmaßnahmen sind in Vorbereitung.								
FD65	05 4047	K 219 /Fahrbahnsanierungsm.	· ·	1.101.553,97	750.000,00	1.851.553,97	1.851.553,97	643.704,56	0,00	unbestimmt	
FD65	05_1247	K 219 / Fanrbannsanierungsm.	Die Baumaßnahme wird ausgeführt. Eine Abschlagsrechnung ist bereits bezahlt.	0.00	050 000 00	050 000 00	050 000 00	F70 000 FF	0.00	1.6	•
FD65	05 4004	ODC Fleffeth Ferrencehennefeligt - Deduction	Die Tiefbauarbeiten des Verkehrsweges werden aktuell	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	579.939,55	0,00	Anfang 2024	
FD65	65_1264	OBS Elsfleth Feuerwehrumfahrt u. Parkplätze									
			planerisch erneut mit den Ergebnissen anderer Ausschreibungen abgeglichen. Ein dauerhaft tragfähiger								
			Unterbau muss mit Ergebnissen einer Baugrunduntersuchung								
			verifiziert werden. Durch Änderungen in der so genannten								
	1		ErsatzbaustoffV ist eine weitere Beratung durch einen								1
	1		Bodengutachter und einen Verkehrsanlagenplaner erforderlich,								0
	1		da erhebliche Änderungen in den Erdbauarbeiten im Raume								
	1		stehen. Darüber hinaus ist noch zu klären, ob eine Änderung								
	1		der Oberfläche (Deckschicht) der Umfahrt möglich ist. Eine								1
	1		Fertigstellung wird voraussichtlich frühestens in der zweiten								1
	1		Jahreshälfte 2024 erreicht werden können.	270.000,00	294.000,00	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	Mitte 2024	
		Zwischensumme / Übertrag		29.840.785.65					15.375.726.49		

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest /	Ermächtigung	Gesamtbudget	beauftragt /	Zahlung	Verfügbares	Fertigstellungszeit	t Maßnahmen-
				Mittelverstärkung	aus		Mittelumbuchung		Budget	punkt	fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		29.840.785,65	Haushaltsplan	53.004.485,65	37.628.759,16	4.662.875,68	15.375.726,49		
FD65	65 1301	OBS Berne/ Bushaltestelle	Für die Fördermaßnahme liegt der Zuwendungsbescheid vor.	29.640.765,05	23.103.700,00	33.004.463,03	37.028.739,10	4.002.073,00	13.373.720,49		
. 200	00_1001	See Some, Suchanostone	Die Bauarbeiten wurden im September 2023 begonnen. Die								
			Fertigstellung ist in 2023 vorgesehen. Im Zusammenhang mit								
			der problematischen Entwässerungsleitung der Gemeinde wurde	,							
			ein kürzerer Weg des abzuleitenden Oberflächenwassers direkt								
			in die Ollen entwickelt, um das vorgeschädigte örtliche								
			Kanalsystem nicht weiter zu belasten.	145.000.00	160.000.00	305,000,00	305.000.00	57,106,13	0.00	Ende 2023	
FD65	65 1309	Poggenb.Str.7/ baul. Maßn. Barrierefreiheit	Durch eine Verzögerung der Auszüge der Mieter und der			,		,			
			Bezirksmeisterei können die größeren Baumaßnahmen (Treppe								0
			und Aufzugsanlage) erst 2024 durchgeführt werden. Die								0
			Planerauswahl hat sich verzögert.	60.000.00	363.000.00	423.000.00	0.00	0.00	423.000.00	Ende 2024	
FD65	65 1327	Parkplatz Gymnasium Brake	Die Fachplaner wurden bereits beauftragt. Das	22.222,22		1	5,55	0,00			
			Ausschreibungsverfahren für Erd-, Kanal- und								
			Straßenbauarbeiten wurde durchgeführt. Die Erd-, Kanal- und								
			Straßenbauarbeiten werden derzeit durchgeführt. Die								
			Straßenbauarbeiten wurden im Oktober abgeschlossen. Der								
			Fahrgastunterstand wird im November geliefert und aufgebaut.								•
			Durch zusätzliche und witterungsbedingte Leistungen								
			(Sandaustausch) ist eine Verstärkung des Budgets erforderlich								
			geworden. Im Zuge der Parkplatzsanierung musste zu nasser								
			Sand ausgetauscht und eine zusätzliche Asphalttragschicht								
			eingebaut werden.	236.000,00	570.000,00	806.000,00	806.000,00	657.086,60	0,00	Ende 2023	
FD65	65_1330	BBS Brake Batterieanl./Sicherheitsbe.	Die Anlage muss dringend erneuert werden. Der genaue								
			Sachstand ist nach dem unerwarteten Tod der bisherigen								0
			Projektleitung noch nicht vollends ermittelt.	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	unbestimmt	
FD65	60_754	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Die K 207 / K 208 Fahrbahn- und Radwegsanierung werden								•
			zusammen durchgeführt und beginnen in Kürze.	597.274,28	1.400.000,00	1.997.274,28	1.730.560,35	1.730.560,35	266.713,93	1. Quartal 2024	•
FD65	65_1202	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)	Ein weiteres Planungsgespräch mit dem								
			Entwässerungsverband, NLStBV und Ingenieurbüro ist geplant.								
			Erst im Anschluss kann eine weitere Entwurfsplanung des								
			Ingenieurbüros erfolgen. Evtl. wäre es möglich, dass das								0
			Planfeststellungsverfahren im Jahr 2024 starten kann. Das								
			Budget wird in 2023 in der veranschlagten Höhe nicht								
			ausgeschöpft.	1.501.289,92	1.068.000,00	2.569.289,92	265.259,00	265.259,00	2.304.030,92	unbestimmt	
FD65	65_1243	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)	Die Ausschreibungen für die Baumfällarbeiten sind veröffentlicht.								
			Diese werden bis 28.02.2024 durchgeführt, so dass im Frühjahr								0
			2024 mit dem Bau des Radweges begonnen werden kann.	2.058.933,14	1.346.000,00	3.404.933,14	115.647,16	115.647,16	3.289.285,98	unbestimmt	
FD91	91_1034	Ausbau Virtualisierung	Das Projekt ist in der Planungsphase. Abstimmungsgespräche								
			zur Realisierung sind in der Umsetzung. Zu beachten ist, dass								0
			die Maßnahmen 91_1034, 91_1341 und 91_1342 in einer								
			Wechselwirkung zueinanderstehen.	0,00	150.000,00	150.000,00	18.728,51	18.728,51	131.271,49	unbestimmt	
FD91	91_1341	zentrales Speichernetzwerk	Das Projekt ist in der Planungsphase. Abstimmungsgespräche								1
			zur Realisierung sind in der Umsetzung. Zu beachten ist, dass								0
			die Maßnahmen 91_1034, 91_1341 und 91_1342 in einer								
			Wechselwirkung zueinanderstehen.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	unbestimmt	1
FD91	91_1342	zentrale Netzwerkkomponenten	Das Projekt ist in der Planungsphase. Abstimmungsgespräche								1
			zur Realisierung sind in der Umsetzung. Zu beachten ist, dass								0
			die Maßnahmen 91_1034, 91_1341 und 91_1342 in einer								
			Wechselwirkung zueinanderstehen.	170.000,00	160.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		
		Gesamtsumme		34.609.282,99	28.821.700,00	63.430.982,99	40.869.954,18	7.507.263,43	22.561.028,81		

Übersicht Darlehensbestand

Liquditätskredite (Kassenkredite) Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2023 Ist - Liquiditätskredite per 31.10.2023 Ausschöpfungsgrad	28.000.000 € 8.000.000 € 28,57%
Investitionskredite	
Gesamt-Darlehensbestand per 31.10.2023 Kreisschulbaukasse Kreditmarkt	90.462.100,67 € 100,00% 1.586.003,87 € 1,75% 88.876.096,80 € 98,25%
Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite	98.462.100,67 €
Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 31.10.2023 Zinszahlungen für langfristige Kredite Darlehensaufnahme Tilgungen Umschuldung	1.246.980,69 € 17.000.000,00 € 4.316.291,34 € - €

- €

0,00%

Krediteri				
Genehmi	ate Kre	ditaufna	hme Ha	ushal

Itssatzung 2023 18.858.400 € lst-Kreditaufnahme per 31.10.2023 Ausschöpfungsgrad

15.121.400 € Ermächtigungen Haushaltssatzung 2022 lst-Kreditaufnahme per 31.10.2023 151.200€ Ermächtigungsrest 14.970.200 € Ausschöpfuungsgrad 1,00%

Pro-Kopf-Verschuldung per 31.10.2023

Einwohnerzahl per 30.06.2023 89.671 990€
