

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Niedersachsen



Herzlich willkommen



Sachstandsbericht zum geförderten und eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau (Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung am 22.02.2024)

A. Geförderter Breitbandausbau durch den Landkreis Wesermarsch

Gewerbegebiete:

- ✓ Ausbau zum 31.12.22 abgeschlossen
- ✓ WL um rd. 490 Tsd. € **geringer** als angeboten (LK: -61 Tsd. €)
- ✓ Schlussverwendungsnachweis in Prüfung beim Bund
- ✓ Monitoring: 34-37 % Netznutzung

Privatadressen:

Ausbau seit dem 28.06.22 bis planmäßig 1. Q. 2024,
aber: EWE hat Verlängerung beantragt bis zum Ende des 3. Q. 2024, der der LK zugestimmt hat
(vorgetragene Gründe: Denkmalschutz, A 20-Trasse, parallele Straßen/Radwege-Sanierungen)

A. Geförderter Breitbandausbau durch den Landkreis Wesermarsch

Sachstand in den Ausbaugebieten

Von insgesamt 185 Projektgebieten (PG) landkreisweit, darunter 19 reinen Mobilfunkanbindungen, ist 1 PK-PG und 6 Mob.funkanbindungen entfallen = 178 PG

Davon wurden **bis Stand 30.01.2024** (Quelle: EWE)

- ✓ alle PG bis spätestens 31.08.23 von der EWE vermarktet
- ✓ in nur 1 PG der Tiefbau noch nicht gestartet (ab 05.02.24 geplant)
- ✓ in 50 PG der Tiefbau vollständig abgeschlossen
- ✓ in 30 PG auch der Bau der Hausanschlüsse erledigt

A. Geförderter Breitbandausbau durch den Landkreis Wesermarsch


Ausblick 2024 ff. (Graue-Flecken-Förderung)

Nds. MW teilt den Breitband-Koordinatoren am 18.07.23 mit, dass „... *davon ausgegangen wird, dass keine neue Landesförderrichtlinie zur Kofinanzierung der Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 aufgestellt werden wird.*“

Nach massiven Protesten der Kommunen und Spitzenverbände sowie des gegründeten Bündnisses „Glasfaserland Niedersachsen“ hat das Land Niedersachsen in den Haushalt 2024 eine weitere Kofinanzierung in Höhe von XX € aufgenommen.

Eine Anpassung der Kofinanzierungsrichtlinie auf die neue Bundes-Richtlinie muss noch erfolgen.

Potenzialanalyse* für den eigenwirtschaftlichen Ausbau im Landkreis Wesermarsch

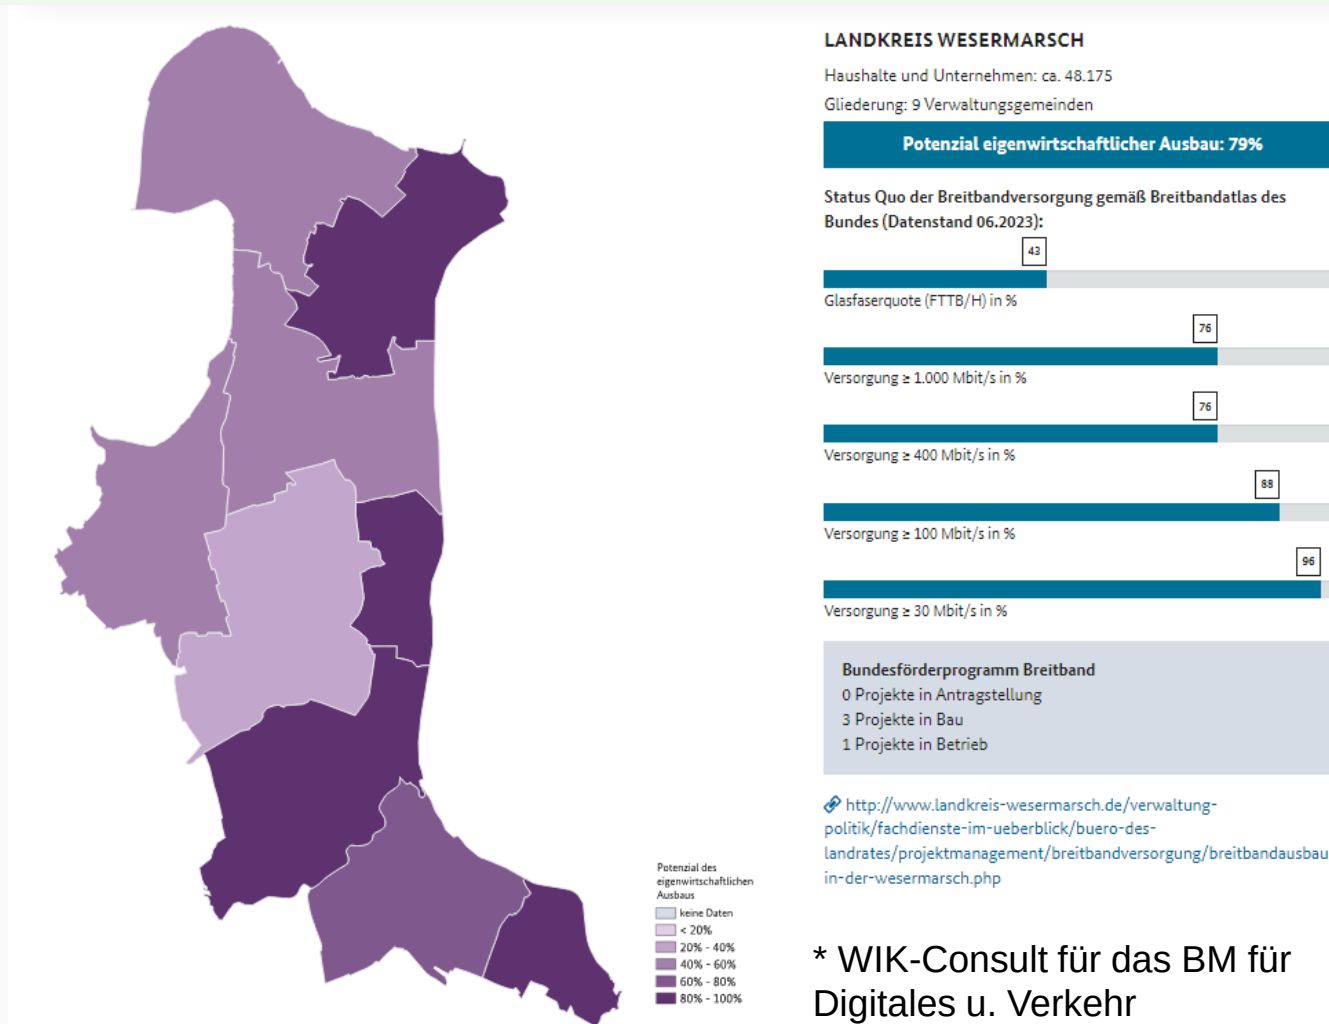

* WIK-Consult für das BM für Digitales u. Verkehr

Potenzialanalyse für den eigenwirtschaftlichen Ausbau im Landkreis Wesermarsch

Status Quo der Breitbandversorgung gemäß Breitbandatlas des Bundes (Datenstand: 06.2023)¹ im Landkreis Wesermarsch

Kommune	=/> 30 Mbit/s	=/> 100 Mbit/s	=/> 400 Mbit/s	=/> 1.000 Mbit/s	Glasfaserquote	Analyse
Butjadingen	92%	73%	46%	46%	19%	noch viele lange Kupferkabel; relativ gutes HFC-Netz*; wenig Glasfaser
Stadland	94%	86%	65%	65%	13%	relativ gutes HFC-Netz*; niedrige Glasfaserquote
Jade	95%	80%	60%	60%	60%	relativ hohe Glasfaserquote durch eigenw. Ausbau der GFNW
Ovelgönne	93%	58%	25%	25%	25%	noch sehr viele lange Kupferkabel; kein HFC-Netz*; wenig Glasfaser
Berne	93%	85%	61%	61%	13%	relativ gutes HFC-Netz*; niedrige Glasfaserquote
Lemwerder	96%	86%	74%	74%	5%	sehr niedrige Glasfaserquote bei hohem Anteil von HFC-Netzen*
Nordenham	99%	98%	97%	97%	60%	sehr hohe Dichte von HFC-Netzen*; Nachholbedarf bei Glasfaserquote
Brake	99%	98%	97%	97%	91%	insgesamt fast sehr gut (fast vollflächiger eigenw. Ausbau durch GFNW)
Elsfleth	95%	85%	64%	64%	9%	relativ hohe Dichte von HFC-Netzen*; sehr niedrige Glasfaserquote
LK Wesermarsch gesamt	96%	88%	76%	76%	43%	

¹Quelle: BMDV-Potenzialanalyse (bmdv.bund.de)

*HFC-Netz: Kabelanschluss über Koaxial-Kabel von Vodafone (Kabeldeutschland)

(hybrid -fibre-coax)

Potenzialanalyse für den eigenwirtschaftlichen Ausbau im Landkreis Wesermarsch

Status Quo der Breitbandversorgung gemäß Breitbandatlas des Bundes (Datenstand: 06.2023)¹ im Landkreis Wesermarsch

Kommune	=/> 30 Mbit/s	=/> 100 Mbit/s	=/> 400 Mbit/s	=/> 1.000 Mbit/s	Glasfaserquote	eigenw. Potenz.	Analyse
Butjadingen	92%	73%	46%	46%	19%	50%	noch viele lange Kupferkabel; relativ gutes HFC-Netz*; wenig Glasfaser
Stadland	94%	86%	65%	65%	13%	52%	relativ gutes HFC-Netz*; niedrige Glasfaserquote
Jade	95%	80%	60%	60%	60%	45%	relativ hohe Glasfaserquote durch eigenw. Ausbau der GFNW
Ovelgönne	93%	58%	25%	25%	25%	29%	noch sehr viele lange Kupferkabel; kein HFC-Netz*; wenig Glasfaser
Berne	93%	85%	61%	61%	13%	68%	relativ gutes HFC-Netz*; niedrige Glasfaserquote
Lemwerder	96%	86%	74%	74%	5%	97%	sehr niedrige Glasfaserquote bei hohem Anteil von HFC-Netzen*
Nordenham	99%	98%	97%	97%	60%	98%	sehr hohe Dichte von HFC-Netzen*; Nachholbedarf bei Glasfaserquote
Brake	99%	98%	97%	97%	91%	98%	insgesamt fast sehr gut (fast vollflächiger eigenw. Ausbau durch GFNW)
Elsfleth	95%	85%	64%	64%	9%	87%	relativ hohe Dichte von HFC-Netzen*; sehr niedrige Glasfaserquote
LK Wesermarsch gesamt	96%	88%	76%	76%	43%	79%	

¹Quelle: BMDV-Potenzialanalyse (bmdv.bund.de)

*HFC-Netz: Kabelanschluss über Koaxial-Kabel von Vodafone (Kabeldeutschland)

(hybrid-fibre-coax)

B. Eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Telekommunikationsunternehmen (hier: GFNW)

Die Glasfaser Northwest hat aktuell in 8 Gebieten knapp 18 Tsd. Haushalte ausgebaut (gerundet):

Brake Mitte – 3.200 Haushalte

Brake Nord – 1.380 Haushalte

Brake Süd – 3.100 Haushalte

Ovelgönne-Großenmeer – 400 Haushalte

Jade-Jaderberg Mitte - 710 Haushalte

Jade-Jaderberg Süd – 460 Haushalte

Nordenham Nord – 3.650 Haushalte

Nordenham Zentrum – 5.010 Haushalte

Quelle: GFNW

B. Eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Telekommunikationsunternehmen (hier: GFNW)

Außerdem ist der Ausbau folgender Neubaugebiete geplant:



475

Haushalte und Unternehmen.



6

Neubaugebiete.



Erschließung seit:

August 2023



- Nordenham (3)
- Ovelgönne (1)
- Stadland (1)
- Golzwarden (1)

B. Eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Telekommunikationsunternehmen (hier: GFNW)



***Kooperationsvereinbarung
zum
eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau
im Landkreis Wesermarsch***

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Matthias Sturm
Breitbandkoordinator
Fachdienst 91 | Büro des Landrats
Telefon 04401 927-384
[breitband @wesermarsch.de](mailto:breitband@wesermarsch.de)
